Gestão de Projetos Tecnológicos

Ma. Steffi Becker

RESUMO DA AULA 2

- Planejamento estratégico
- Partes interessadas
- Complexidade de projetos
- Gestão da qualidade
- Indicadores

METAS DE APRENDIZAGEM

Aula 3 - Gerenciamento do projeto

Fases e execução de um projeto

O desenvolvimento de projetos é como moldar o futuro com a combinação de criatividade, disciplina e determinação.

Desconhecido

Benefícios com a Utilização da Metodologia de Gestão de Projetos

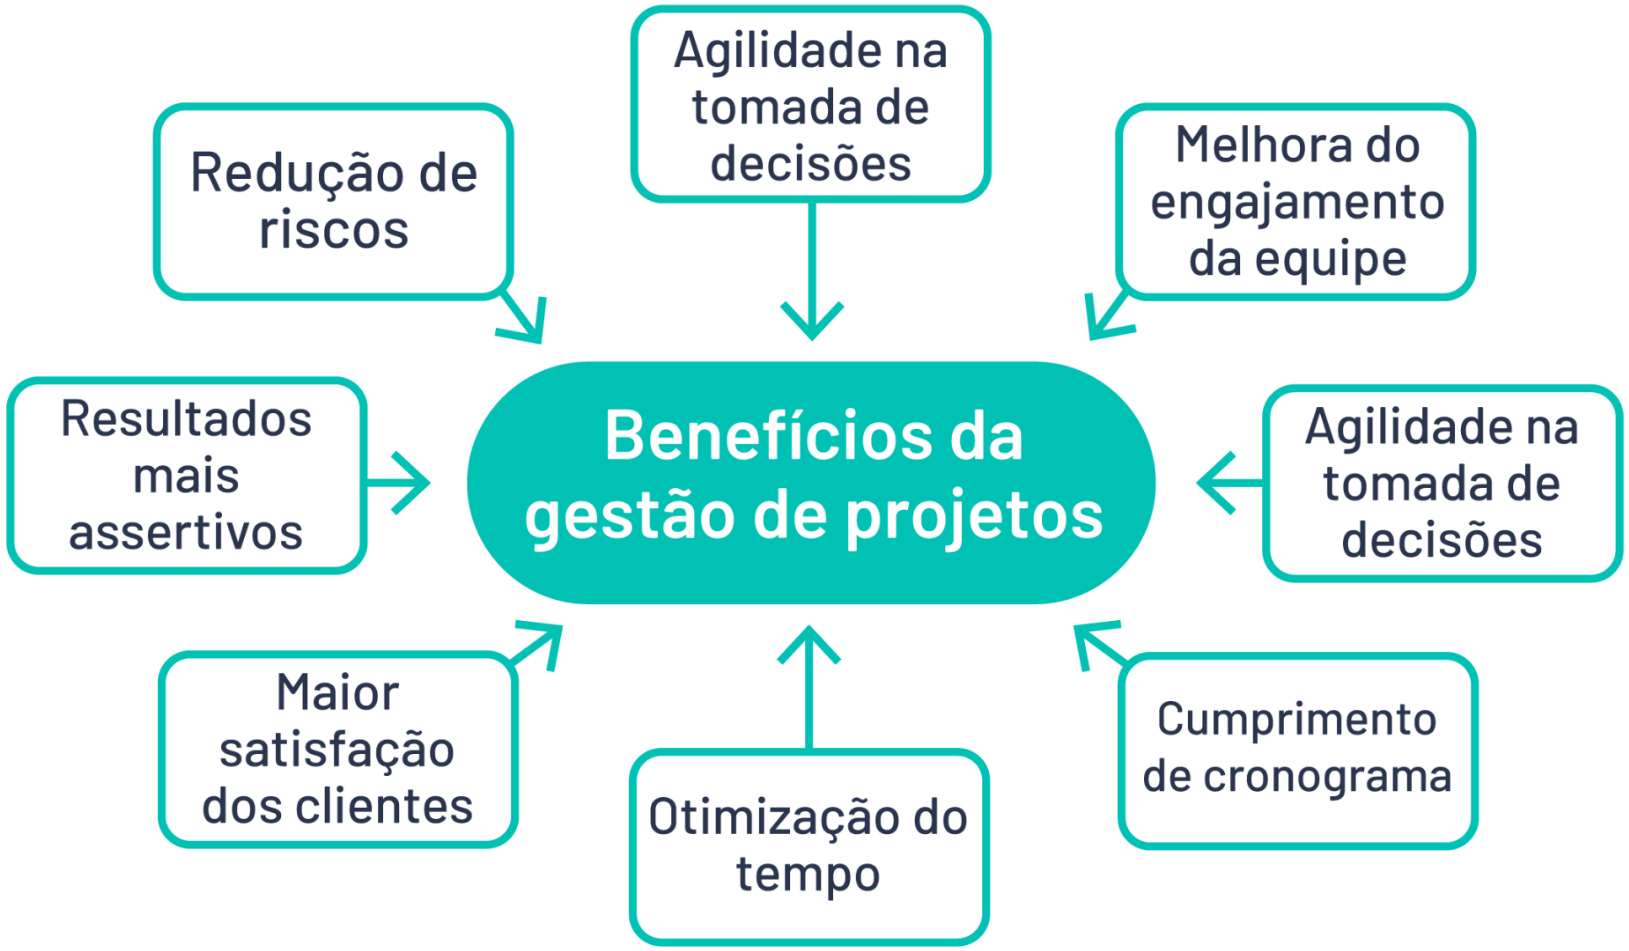

Fonte da imagem:

Tipos de Projetos

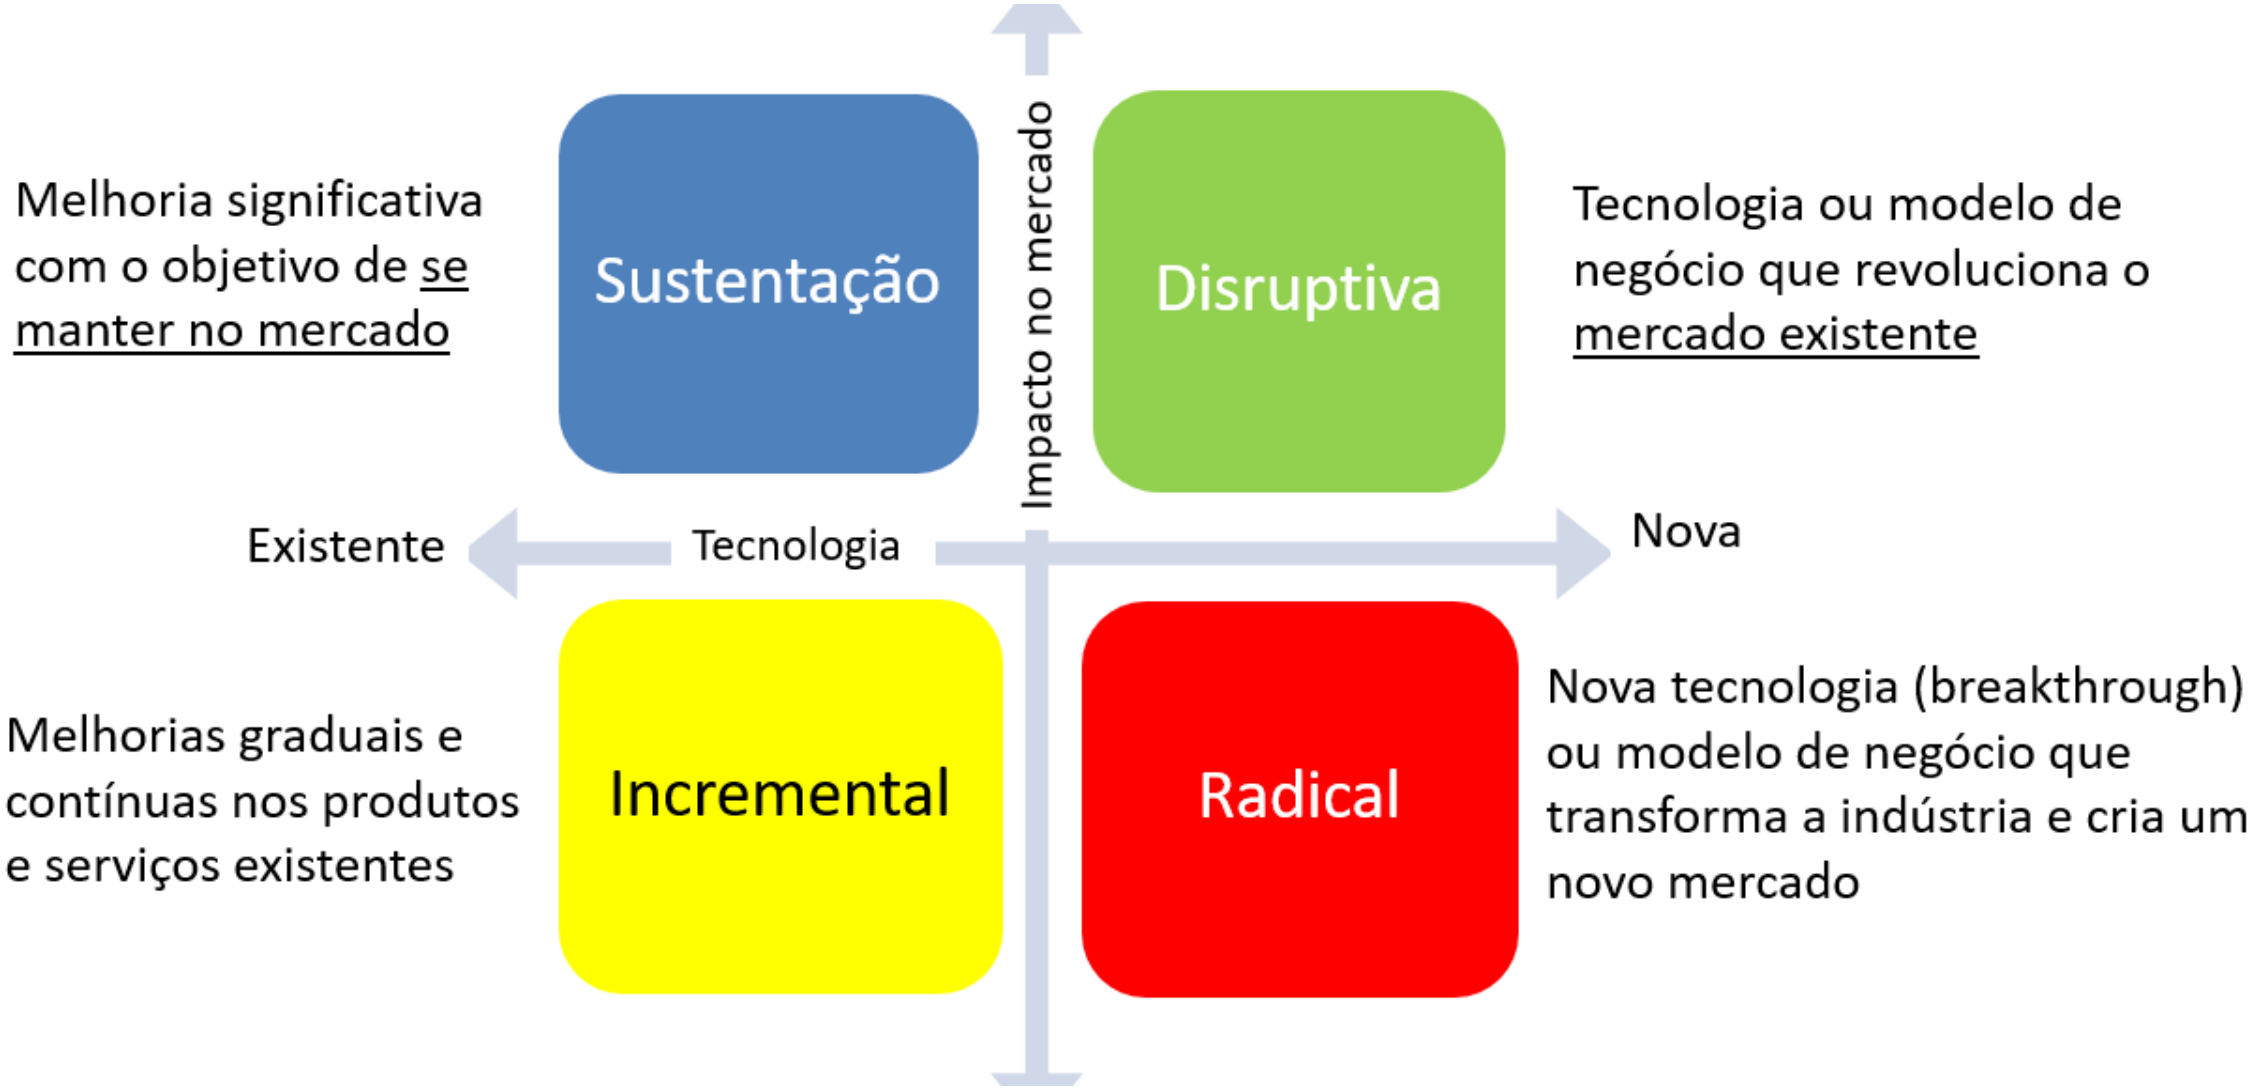

Fonte da imagem:

Fases de um projeto

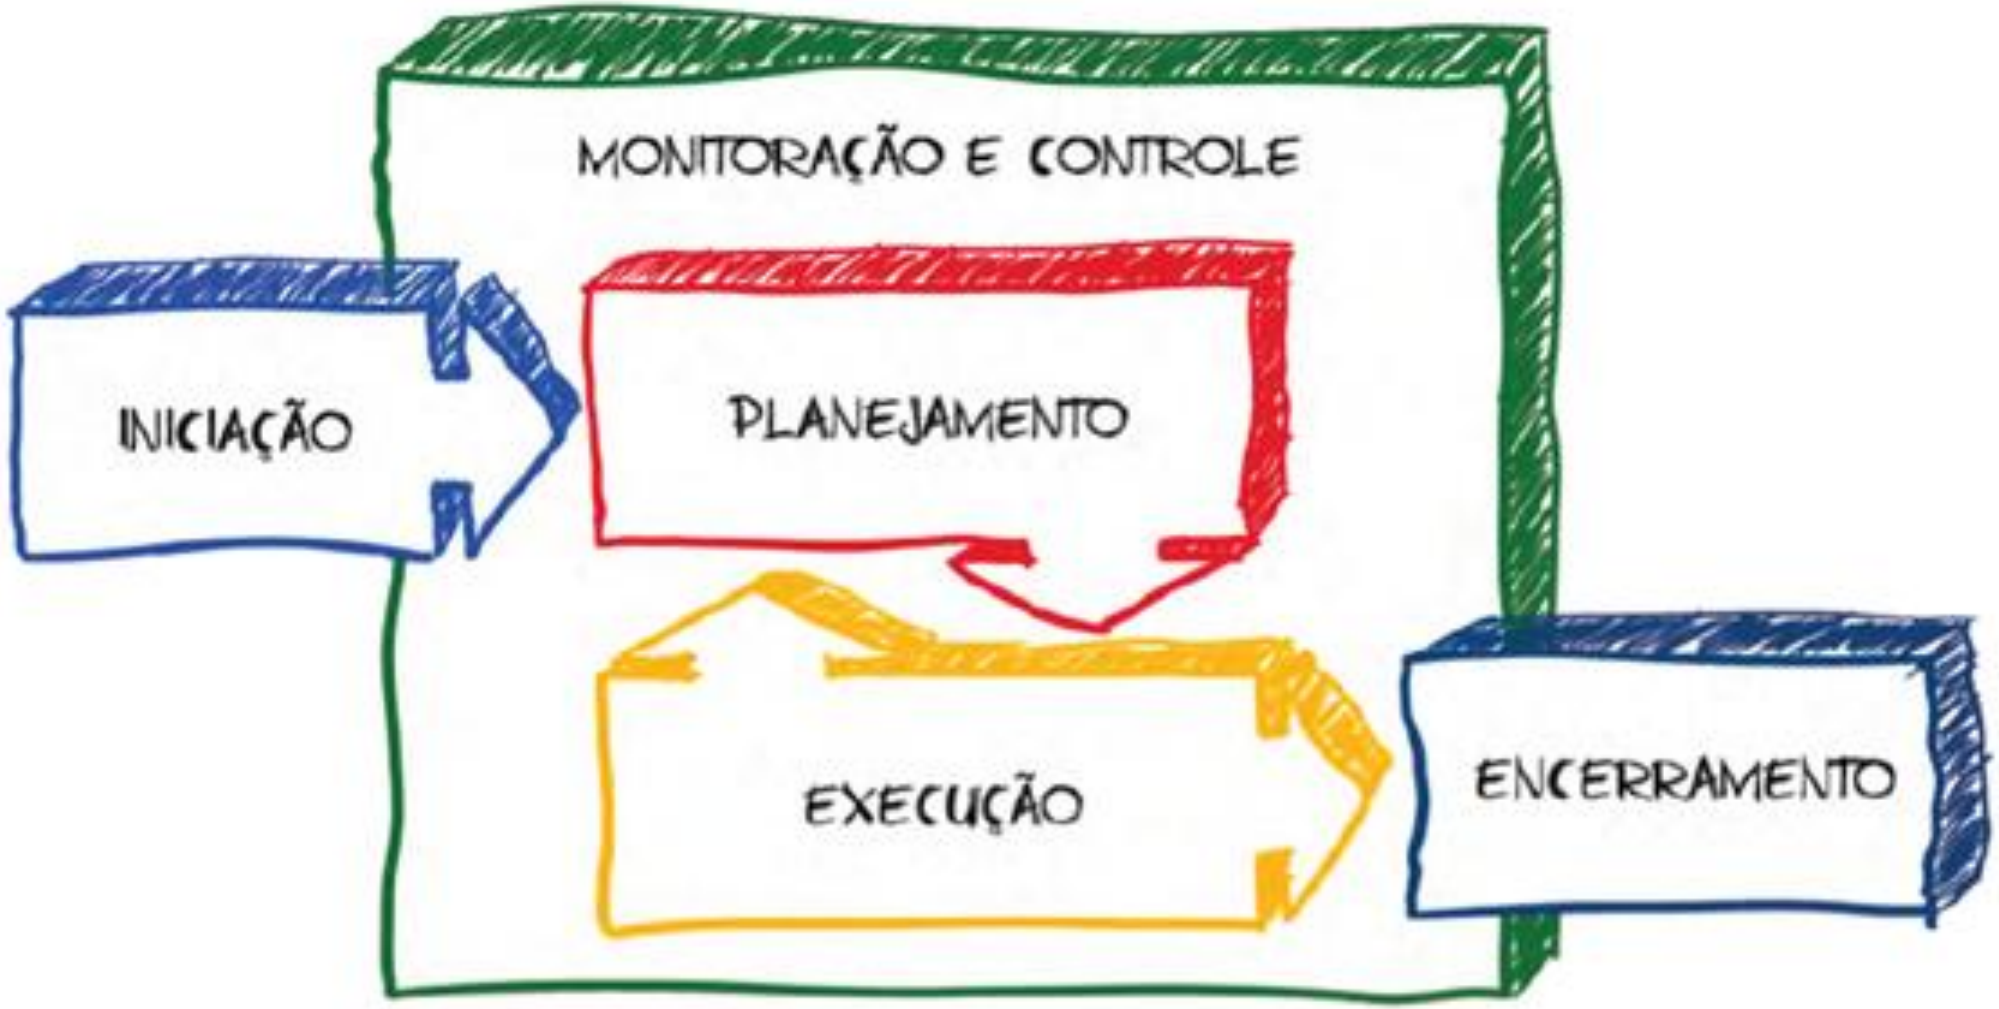

Fonte da imagem:

INICIAÇÃO

Iniciação

- Desenvolver o termo de abertura
- Identificar as partes interessadas

Termo de abertura do projeto

- formaliza início do projeto
- dá autoridade necessária ao gerente de projetos

Contém

- principais responsáveis
- requisitos iniciais
- principais entregas
- premissas
- restrições

Envolvidos no projeto e Partes interessadas

Quem será impactado?

Todas as áreas ou pessoas que podem ser impactados com o projeto (antes durante e depois)

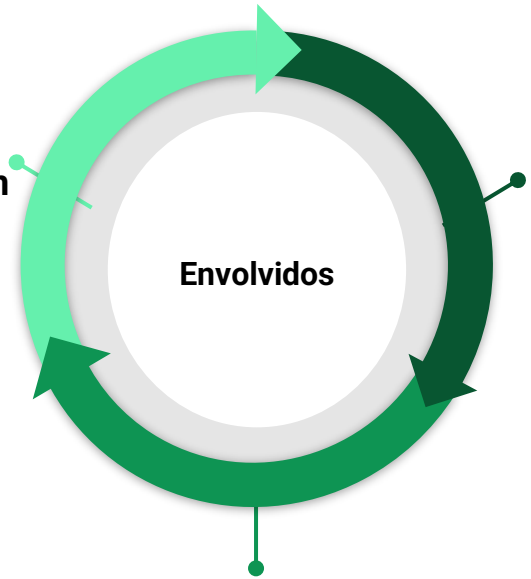

Quem irá desenvolver?

Todas as pessoas ou áreas que serão demandadas durante o projeto

Quem precisa ser informado?

Um projeto pode fazer parte de algo muito maior. É necessário saber quais pessoas precisam ser informadas sobre o projeto

Fonte da imagem:

TERMO DE ABERTURA

Por que?	Estabelecer objetivos claros e alcançáveis
O que?	Definir produtos e requisitos para atender os objetivos
Quem?	Adaptar às diferentes expectativas das partes interessadas
Como?	Definir estrutura do projeto
Quando?	Cronograma
Quanto?	Orçamento

Fonte da imagem:

PLANEJAMENTO

☑	Plano de Gestão de Projetos
☑	Definição do Escopo do Projeto
☑	Aquisições
☑	Planejamento de Recursos Financeiros
☑	Planejamento de Recursos Humanos
☑	Análise de Riscos
☑	Indicadores
☑	Definição dos padrões de Qualidade
☑	Plano de Comunicação
☑	Definição do Cronograma

PLANEJAMENTO - DEFINIÇÃO DE ESCOPO

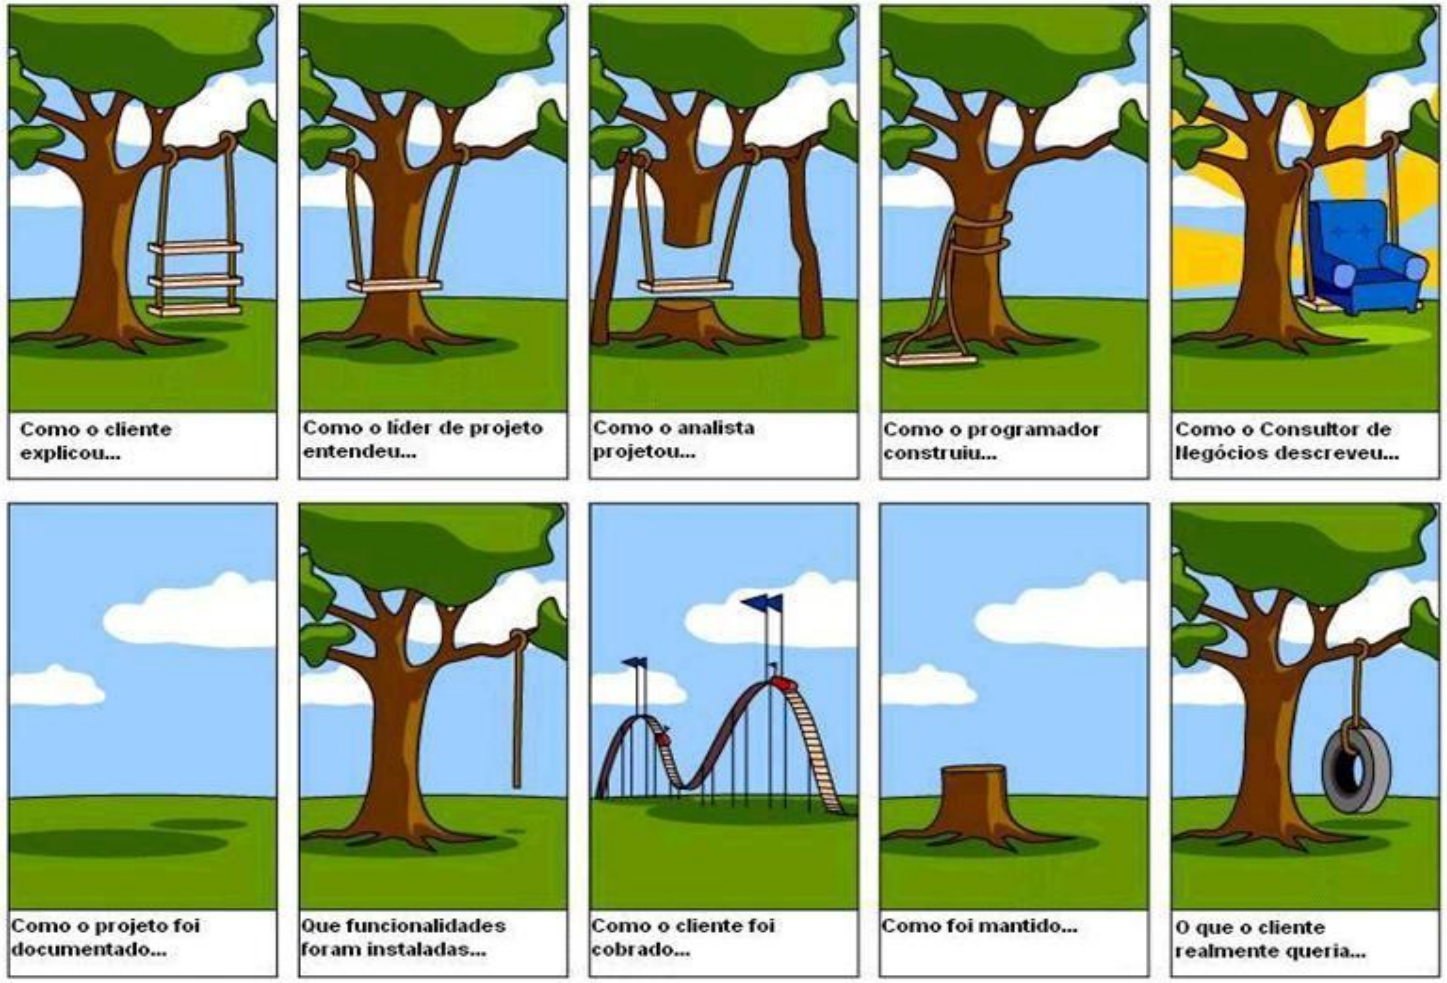

Requisitos e Regras

Fonte da imagem:

REQUISITOS E REGRAS

Regra de Negócio:

- **Sistema de Empréstimo Bancário**: A solicitação de um novo empréstimo pelo cliente no produto Alfa está condicionado se tiver quitado pelo menos 75% do saldo de um empréstimo anterior e não tiver dívidas pendentes, para que o banco não tenha risco de inadimplência.

Requisito de Usuário:

- **Aplicativo de Banco**: O usuário deve ser capaz de visualizar o saldo de sua conta corrente e o histórico das últimas 10 transações diretamente na tela inicial do aplicativo.

Requisito de Sistema:

- **Sistema de Cadastro de Clientes**: O sistema deve validar o número de CPF ao cadastrar um novo cliente, garantindo que ele seja único e esteja no formato correto, com 11 dígitos.

REQUISITOS E REGRAS – GARANTE A QUALIDADE DOS DEMAIS REQUISITOS

Requisito de Qualidade:

- **Segurança**: O sistema deve criptografar todos os dados sensíveis (como senhas e informações financeiras) tanto em trânsito quanto em repouso, seguindo as normas de segurança PCI-DSS
- **Desempenho**: O tempo de carregamento da página de checkout não deve exceder 2 segundos sob uma carga de até 1000 usuários simultâneos, garantindo uma experiência rápida e fluida ao cliente.
- **Aderência a testes:** Para aprovação da primeira etapa de testes, a aderência mínima dos requisitos deverá ser de 85%

ESTRUTURA DE REQUISITOS E REGRAS

Sistema de Empréstimo Bancário: A solicitação de um novo empréstimo pelo cliente no produto Alfa está condicionado se tiver quitado pelo menos 75% do saldo de um empréstimo anterior e não tiver dívidas pendentes, para que o banco não tenha risco de inadimplência.

ATIVIDADE EXTRA - MONTANDO REQUISITOS

Solicitação cliente: O Banco deseja que os cientes possam acessar o aplicativo e realizar a solicitação de um empréstimo condicionado ao limite de credito que ele possui

Requisito de Negócios:

Requisito de Usuário:

Requisito de Sistema

Requisito de Qualidade

Cronograma

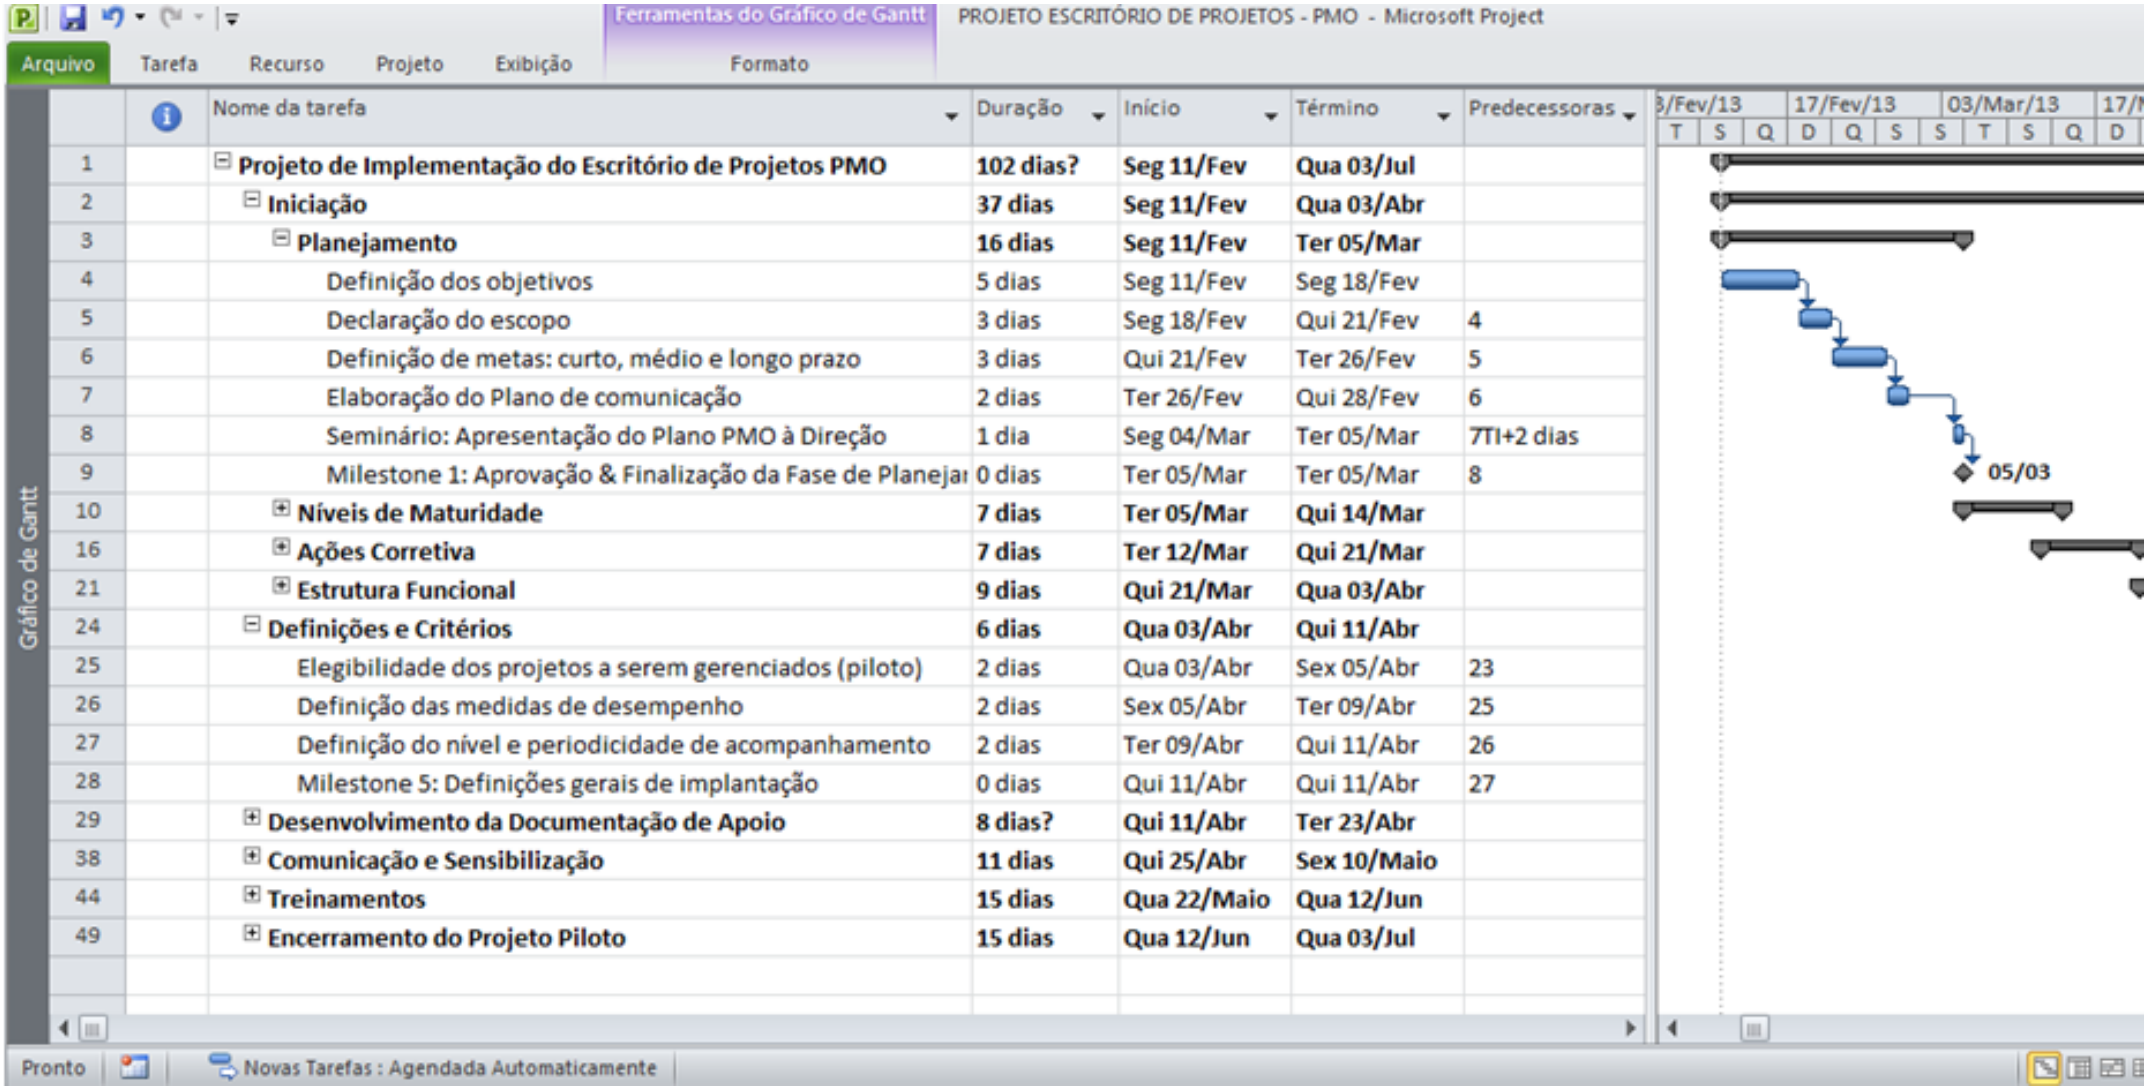

	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras
1	**Projeto de Implementação do Escritório de Projetos PMO**	**102 dias?**	**Seg 11/Fev**	**Qua 03/Jul**	
2	**Iniciação**	**37 dias**	**Seg 11/Fev**	**Qua 03/Abr**	
3	**Planejamento**	**16 dias**	**Seg 11/Fev**	**Ter 05/Mar**	
4	Definição dos objetivos	5 dias	Seg 11/Fev	Seg 18/Fev	
5	Declaração do escopo	3 dias	Seg 18/Fev	Qui 21/Fev	4
6	Definição de metas: curto, médio e longo prazo	3 dias	Qui 21/Fev	Ter 26/Fev	5
7	Elaboração do Plano de comunicação	2 dias	Ter 26/Fev	Qui 28/Fev	6
8	Seminário: Apresentação do Plano PMO à Direção	1 dia	Seg 04/Mar	Ter 05/Mar	7TI+2 dias
9	Milestone 1: Aprovação & Finalização da Fase de Planejar	0 dias	Ter 05/Mar	Ter 05/Mar	8
10	**Níveis de Maturidade**	**7 dias**	**Ter 05/Mar**	**Qui 14/Mar**	
16	**Ações Corretiva**	**7 dias**	**Ter 12/Mar**	**Qui 21/Mar**	
21	**Estrutura Funcional**	**9 dias**	**Qui 21/Mar**	**Qua 03/Abr**	
24	**Definições e Critérios**	**6 dias**	**Qua 03/Abr**	**Qui 11/Abr**	
25	Elegibilidade dos projetos a serem gerenciados (piloto)	2 dias	Qua 03/Abr	Sex 05/Abr	23
26	Definição das medidas de desempenho	2 dias	Sex 05/Abr	Ter 09/Abr	25
27	Definição do nível e periodicidade de acompanhamento	2 dias	Ter 09/Abr	Qui 11/Abr	26
28	Milestone 5: Definições gerais de implantação	0 dias	Qui 11/Abr	Qui 11/Abr	27
29	**Desenvolvimento da Documentação de Apoio**	**8 dias?**	**Qui 11/Abr**	**Ter 23/Abr**	
38	**Comunicação e Sensibilização**	**11 dias**	**Qui 25/Abr**	**Sex 10/Maio**	
44	**Treinamentos**	**15 dias**	**Qua 22/Maio**	**Qua 12/Jun**	
49	**Encerramento do Projeto Piloto**	**15 dias**	**Qua 12/Jun**	**Qua 03/Jul**	

Fonte da imagem:

EXECUÇÃO / DESENVOLVIMENTO

- Entendimento do projeto.
- Levantamento de pontos de atenção.

- Definição de como será desenvolvido

- Codificação
- Mudanças
- Integrações
- Prototipagem
- Gestão de equipe

- Critérios de aceite
- Cenários de testes
- Homologação
- Re-testes

- Entrega
- Produção
- Ajustes

Monitoramento e controle

Fonte da imagem:

Indicadores

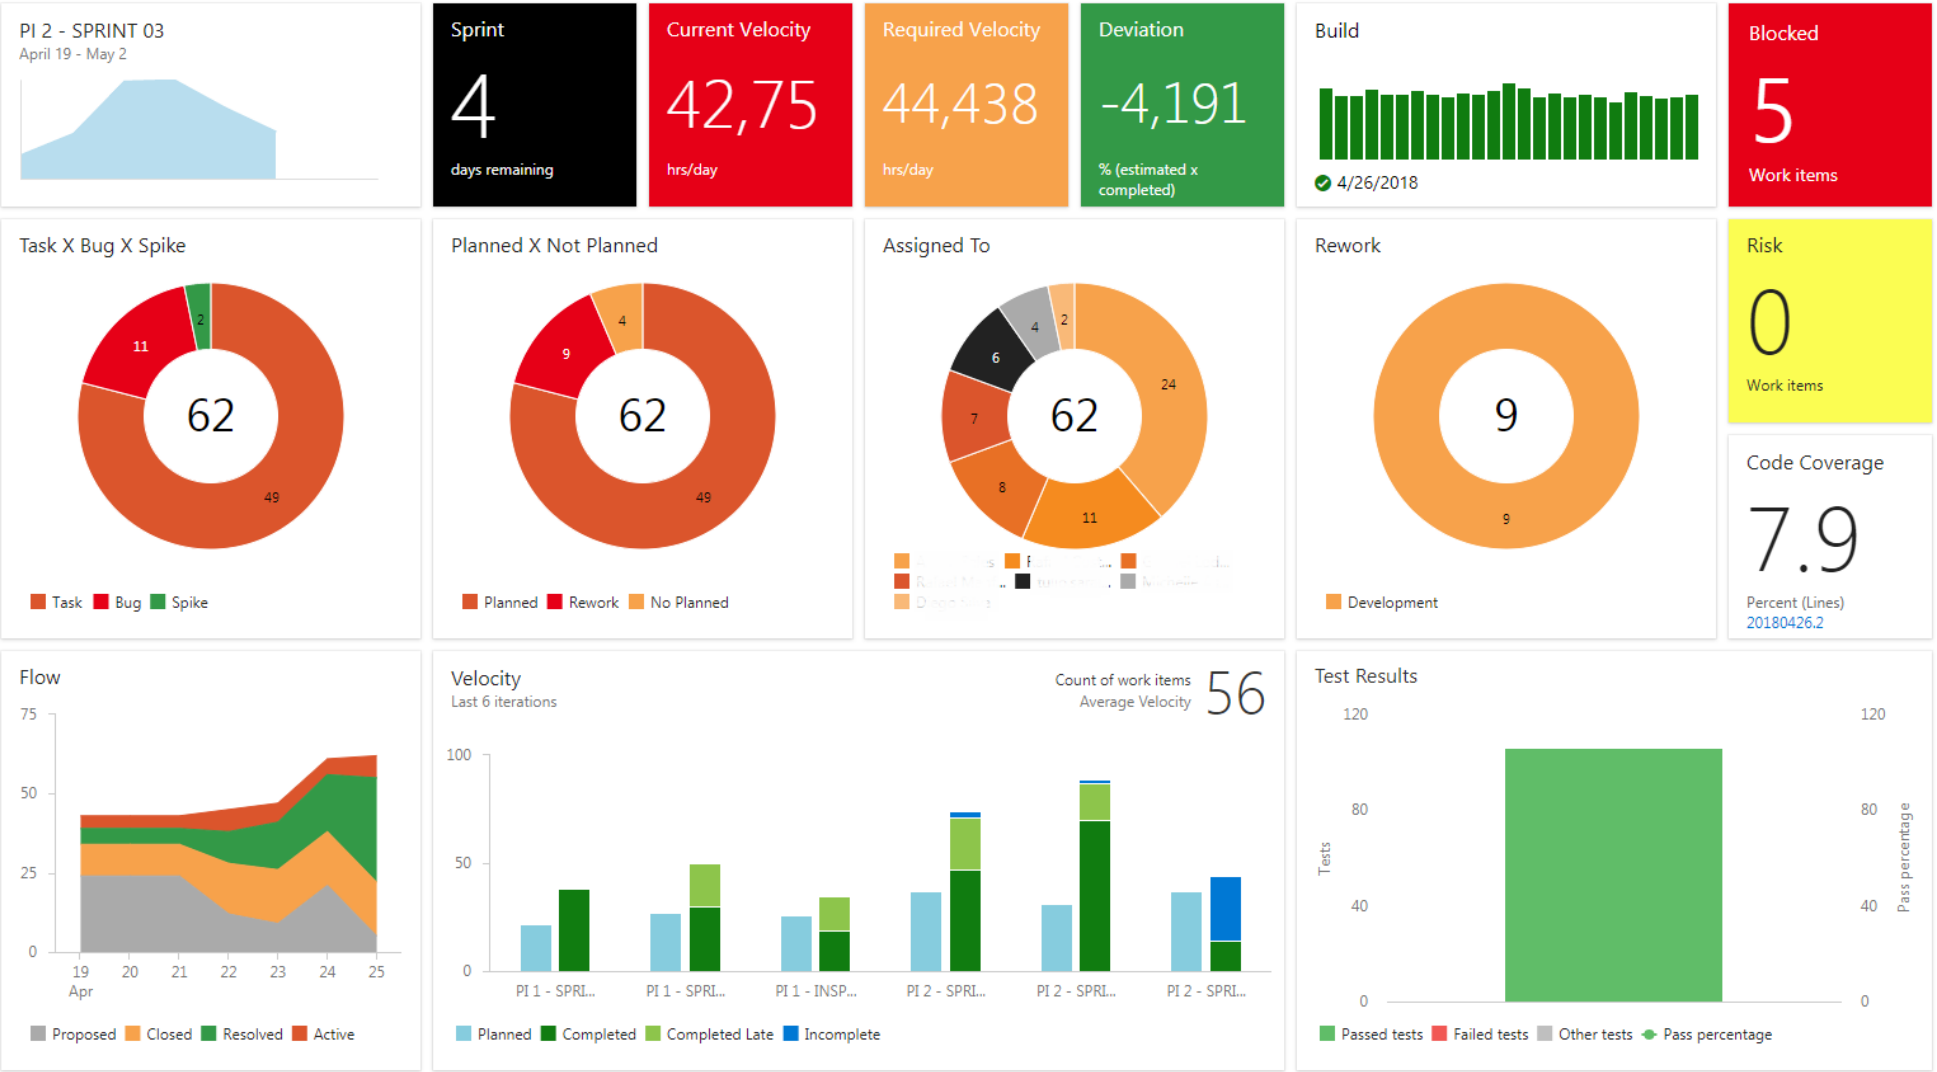

Fonte da imagem:

GESTÃO DE MUDANÇAS

1

solicitante

Pedido de Mudança

- Descrição
- Benefícios
- Justificativa

2

Equipe de Projeto

Avaliação do Pedido

- Impacto nos custos
- Impacto nos prazos
- Novos riscos identificados

3

Patrocinador ou
Comitê de Mudanças

Aprovação ou Rejeição

- Justificativa da decisão
- Divulgação do parecer

ENCERRAMENTO

☑	Apresentação da entrega
☑	Termo de aceite
☑	Lições aprendidas
☑	Fechamento das documentações
☑	Fechamento dos monitoramentos
☑	Avaliação da equipe
☑	Encerramento oficial

GESTÃO DO CONHECIMENTO DO PROJETO

- Gerenciar o conhecimento do projeto – Processo de Execução (PMI, 2017).
- Coletar lições aprendidas – Processo de Encerramento (ISO 21500:2012).
- Tipos de conhecimento (Nonaka e Toyama, 2003):
    - **Tácito:** é de difícil formalização e compartilhamento, pois possui duas dimensões, a técnica e a cognitiva. A dimensão técnica está associada ao know-how pessoal, enquanto a cognitiva inclui credos, ideais, valores e modelos.
    - **Explícito:** pode ser compartilhado de forma sistemática na forma de dados, fórmulas científicas, recursos visuais, especificações de produtos ou manuais, pois já está codificado.

Dúvidas e próxima aula

Fonte da imagem:

BONS ESTUDOS
